Tímaplan Skóflan_ Vesturgata-Prufa-6-baseline

ID	WBS	Name	Duration	Start	Finish	Actual Start	Actual Finish
1	**1**	**Vesturgata Endurbygging**	**159 days**	**Tue 28.3.17**	**Fri 3.11.17**	**Tue 28.3.17**	**NA**
2	1.1	Vesturgata áfangi 1	137 days	Tue 28.3.17	Wed 4.10.17	Tue 28.3.17	NA
3	1.2	Vesturgata áfangi 2	85 days	Mon 10.7.17	Fri 3.11.17	Mon 10.7.17	NA
4	**2**	**Aðstaða**	**91 days**	**Mon 8.5.17**	**Mon 11.9.17**	**Mon 8.5.17**	**NA**
5	2.1	Aðstaða, áfangi 1	6 days	Mon 8.5.17	Mon 15.5.17	Mon 8.5.17	Mon 15.5.17
6	2.2	Aðstaða, áfangi 2	25 days	Tue 8.8.17	Mon 11.9.17	Tue 8.8.17	NA
7	**3**	**Gangstéttar**	**118 days**	**Fri 19.5.17**	**Tue 31.10.17**	**Fri 19.5.17**	**NA**
8	3.1	Gangstéttar Mokstur/fylling, áfangi 1	87 days	Fri 19.5.17	Mon 18.9.17	Fri 19.5.17	Mon 18.9.17
9	3.2	Gangstéttar Frágangur, áfangi 1	20 days	Wed 27.9.17	Tue 24.10.17	Wed 27.9.17	NA
10	3.3	Gangstéttar, Mokstur/fylling, áfangi 2	13 days	Fri 22.9.17	Fri 27.10.17	Fri 22.9.17	Fri 27.10.17
11	3.4	Gangstéttar, Frágangur, áfangi 2	2 days	Mon 30.10.1	Tue 31.10.17	NA	NA
12	**4**	**Uppgröftur**	**88 days**	**Mon 12.6.17**	**Wed 11.10.1**	**Mon 12.6.17**	**NA**
13	4.1	Uppgröftur, áfangi 1	31 days	Mon 12.6.17	Mon 24.7.17	Mon 12.6.17	Mon 24.7.17
14	4.2	Uppgröftur, áfangi 2	25 days	Thu 7.9.17	Wed 11.10.1	Thu 7.9.17	NA
15	**5**	**Fyllingar**	**78 days**	**Thu 6.7.17**	**Mon 23.10.1**	**Thu 6.7.17**	**NA**
16	5.1	Fylling, áfangi 1	57 days	Thu 6.7.17	Fri 22.9.17	Thu 6.7.17	NA
17	5.2	Fylling, áfangi 2	22 days	Fri 22.9.17	Mon 23.10.1	NA	NA
18	**6**	**Holræsi**	**131 days**	**Fri 21.4.17**	**Fri 20.10.17**	**Fri 21.4.17**	**NA**
19	6.1	Holræsi, áfangi 1	96 days	Fri 21.4.17	Fri 1.9.17	Fri 21.4.17	Fri 1.9.17
20	6.2	Holræsi, niðurföll, áfangi 1	45 days	Tue 18.7.17	Fri 22.9.17	Tue 18.7.17	Fri 22.9.17
21	6.3	Holræsi, áfangi 2	9 days	Fri 22.9.17	Fri 20.10.17	NA	NA
22	6.4	Holræsi, niðurföll, áfangi 2	9 days	Tue 10.10.17	Fri 20.10.17	NA	NA
23	**7**	**Kalt Vatn**	**97 days**	**Fri 19.5.17**	**Mon 2.10.17**	**Fri 19.5.17**	**NA**
24	7.1	Kalt vatn Bráðabyrðatenging, áfangi 1	16 days	Fri 19.5.17	Fri 9.6.17	Fri 19.5.17	Fri 9.6.17
25	7.2	Kalt vatn, tenging, Ægisbraut	26 days	Mon 19.6.17	Mon 24.7.17	Mon 19.6.17	Mon 24.7.17
26	7.3	Kalt vatn tenging, áfangi 1	25 days	Mon 10.7.17	Mon 28.8.17	Mon 10.7.17	Mon 28.8.17
27	7.4	Kalt vatn tenging, áfangi 2	25 days	Fri 11.8.17	Mon 2.10.17	Fri 11.8.17	NA
28	**8**	**Hitaveita**	**101 days**	**Mon 15.5.17**	**Mon 2.10.17**	**Mon 15.5.17**	**NA**
29	8.1	Hitaveita, áfangi 1	60 days	Mon 15.5.17	Fri 4.8.17	Mon 15.5.17	Fri 4.8.17
30	8.2	Hitaveita, áfangi 2	37 days	Fri 11.8.17	Mon 2.10.17	Fri 11.8.17	NA
31	**9**	**Rafmagn**	**37 days**	**Fri 11.8.17**	**Mon 2.10.17**	**Fri 11.8.17**	**NA**
32	9.1	Rafmagn, áfangi 2	37 days	Fri 11.8.17	Mon 2.10.17	Fri 11.8.17	NA
33	**10**	**Míla**	**37 days**	**Fri 11.8.17**	**Mon 2.10.17**	**Fri 11.8.17**	**NA**
34	10.1	Míla, áfangi 2	37 days	Fri 11.8.17	Mon 2.10.17	Fri 11.8.17	NA
35	**11**	**Yfirborðsfrágangur**	**25 days**	**Wed 20.9.17**	**Tue 24.10.17**	**Wed 20.9.17**	**NA**
36	11.1	Yfirborðsfrágangur, áfangi 1	3 days	Wed 20.9.17	Fri 22.9.17	Wed 20.9.17	NA
37	11.2	Yfirborðsfrágangur, áfangi 2	5 days	Wed 18.10.1	Tue 24.10.17	NA	NA
38	**12**	**Malbikun**	**35 days**	**Mon 25.9.17**	**Fri 10.11.17**	**NA**	**NA**
39	12.1	Malbik, áfangi 1	1 day	Mon 25.9.17	Mon 25.9.17	NA	NA
40	12.2	Steypa, áfangi 1, gangstéttar	16 days	Wed 27.9.17	Wed 18.10.1	NA	NA
41	12.3	Malbik, áfangi 2	1 day	Thu 26.10.17	Thu 26.10.17	NA	NA
42	12.4	Steypa, áfangi 2, gangstéttar	10 days	Mon 30.10.1	Fri 10.11.17	NA	NA
43	**13**	**Kantsteinn**	**24 days**	**Tue 26.9.17**	**Fri 27.10.17**	**NA**	**NA**
44	13.1	Kantsteinn, áfangi 1	1 day	Tue 26.9.17	Tue 26.9.17	NA	NA
45	13.2	Kantsteinn, áfangi 2	1 day	Fri 27.10.17	Fri 27.10.17	NA	NA
46	**14**	**Hraðahindrun**	**11 days**	**Fri 27.10.17**	**Fri 10.11.17**	**NA**	**NA**
47	14.1	Hraðahindrun	11 days	Fri 27.10.17	Fri 10.11.17	NA	NA
48	**15**	**Málun**	**5 days**	**Mon 6.11.17**	**Fri 10.11.17**	**NA**	**NA**
49	15.1	Málun	5 days	Mon 6.11.17	Fri 10.11.17	NA	NA
50	**16**	**Frágangur**	**10 days**	**Mon 30.10.1**	**Fri 10.11.17**	**NA**	**NA**
51	15.1	Frágangur	10 days	Mon 30.10.1	Fri 10.11.17	NA	NA

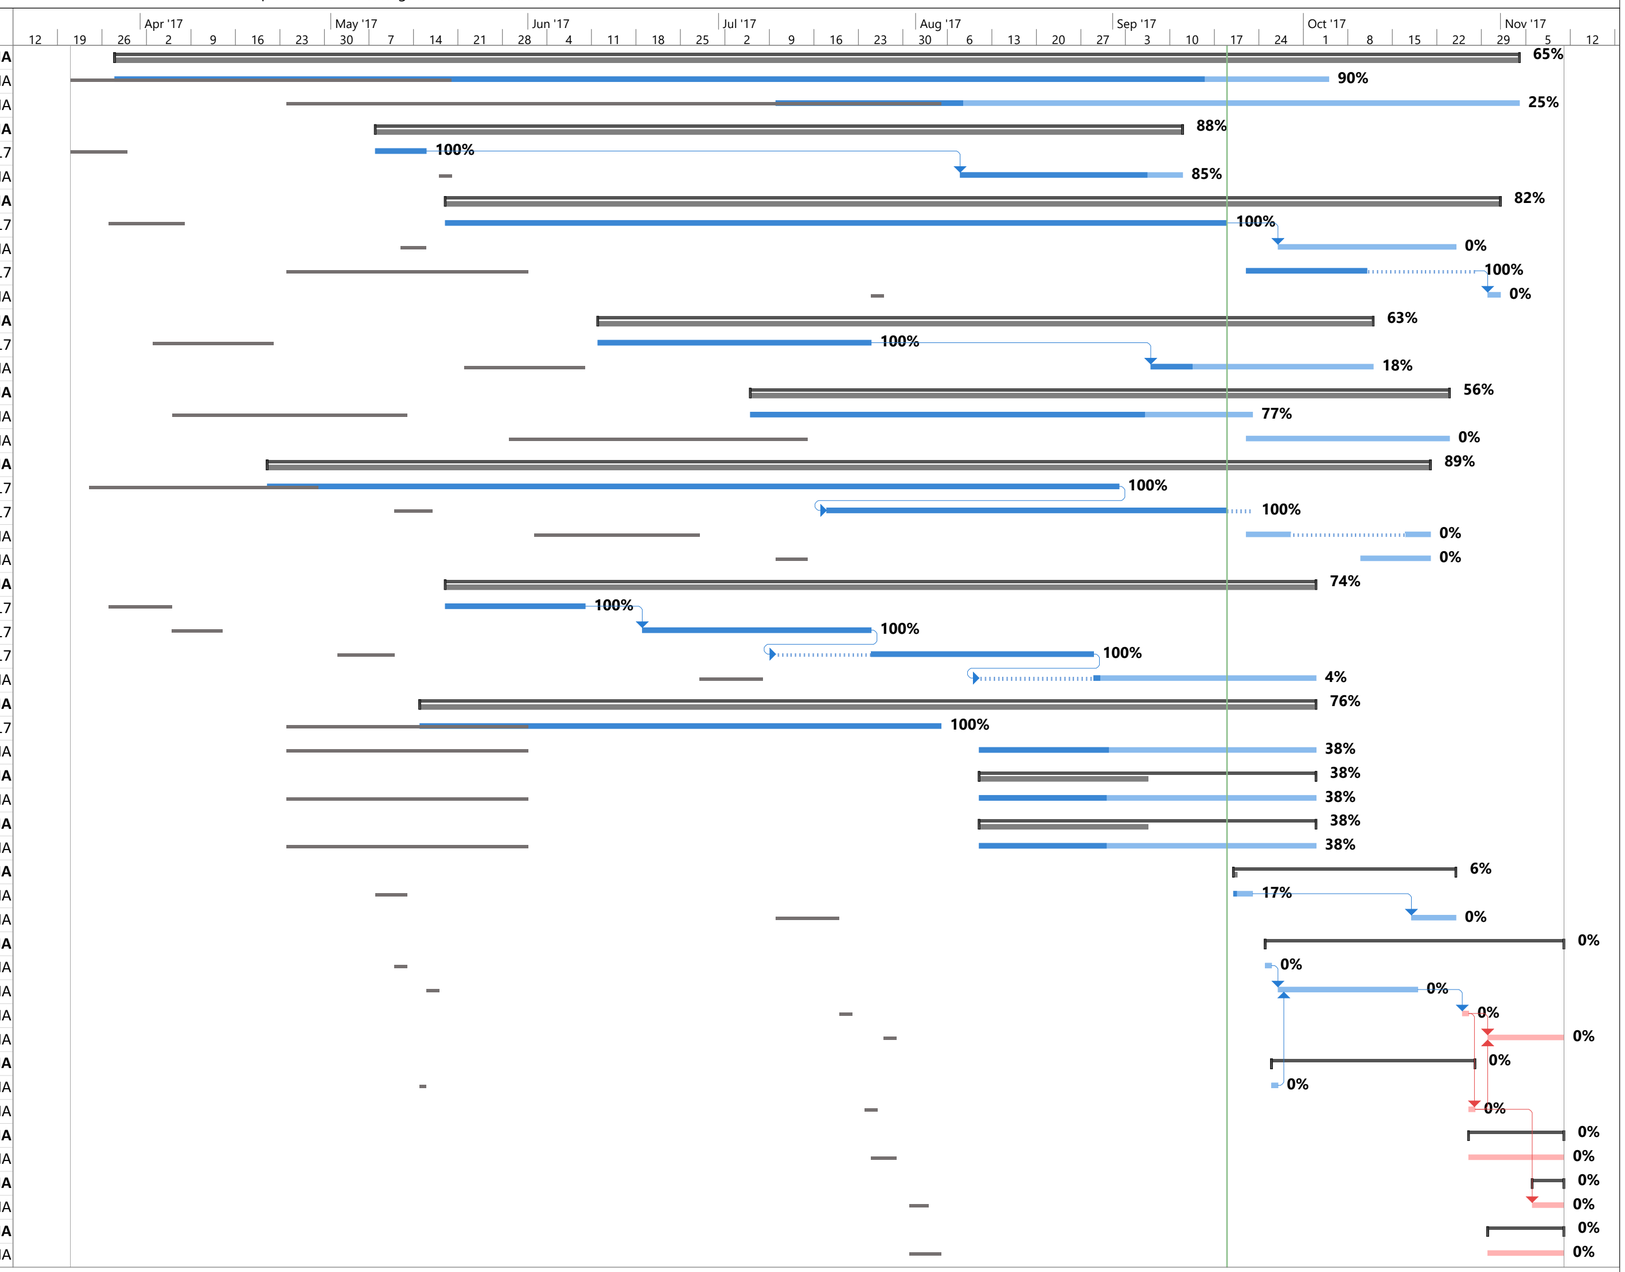

Critical | Critical Split | Critical Progress | Task | Split | Task Progress | Manual Task | Start-only | Finish-only | Duration-only | Baseline | Baseline Split | Baseline Milestone | Milestone | Summary Progress | Summary | Manual Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Deadline
